

BLVC-memo

Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Veiligheid
Communicatie



2 mei – 9 mei 2018

Onderhoud verharding
Van Voorstlaan te Abbenes
Q2 2018

Ingenieursbureau

Datum: 28-03-2018
Planfase: Uitvoering
Status: Definitief
Werkordernummers: **301226**
Office 365: *ABS – Van Voorstlaan bakfrezen, EAB en herstraten*
Steller: Peter van der Sterren

	Naam	Paraaf	Datum
Projectleider:	J. den Breejen		
Werkvoorbereider:	W. Kwinkelenberg		

Inhoudsopgave

Inleiding		3
Omgevingsanalyse		4
Bereikbaarheid		4
Leefbaarheid		5
Veiligheid		5
Communicatie		5
Bijlage 1	Route bouwverkeer	6
Bijlage 2	Route bouwverkeer	7
Bijlage 3	Verspreidingsgebied bewonersbrief	8
Bijlage 4	Communicatieplanning	9

Inleiding


Aan de uiterste westflank van Abbenes ligt de Van Voorstlaan.

Een deel van deze weg ondergaat regulier onderhoud.

De werkzaamheden houden het volgende in:

- Toplaag frezen
- Bakfrezen
- Aanbrengen deklaag
- Herstraten aanwezige bestrating van aanliggende parkeervakken (daar waar nodig)
- Herstraten entree sportveld en voetpad voor garages

Voor een overzicht van de locatie zie figuur 1 en bijlage 1.

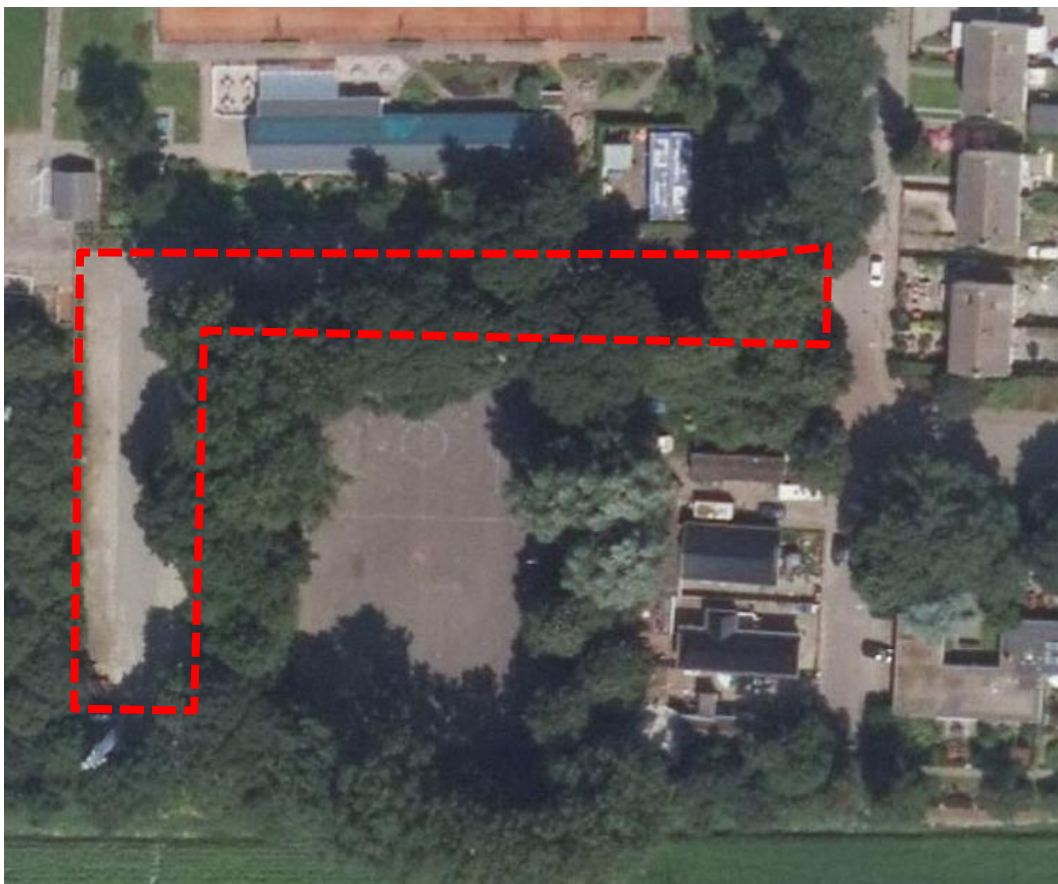

Figuur 1: Overzicht locatie werkzaamheden Van Voorstlaan te Abbenes
(bron: www.argis.com)

De werkzaamheden vinden plaats van 2 tot en met 9 mei 2018.

In dit BLVC-memo staat beschreven hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de veiligheid en de communicatie; gevolgen van de projectuitvoering voor de omgeving en gebruikers komen zo in beeld. Tevens worden voorwaarden aangegeven voor de aannemer met betrekking tot de BLVC-aspecten.

Omgevingsanalyse

Het deel van de Van Voorstlaan dat wordt onderhouden heeft de volgende verkeerskundige kenmerken:

- maximum snelheid bedraagt 30 km/h
- de weg heeft een ontsluitende functie voor de sportvereniging Abbebes
- parkeren voor bezoekers (per auto) geschiedt op aanwezige haaks parkeerplaatsen

Er zijn géén overige woningen of panden die ontsluiten op dit deel van de Van Voorstlaan.

In de nabijheid vinden géén projecten plaats die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden.

Bereikbaarheid

Sportvereniging Abbenes

- de sportvereniging blijft op woensdag, zaterdag en zondag bereikbaar; dit geldt voor de rijweg en de aanwezige parkeerplaatsen
- Een omleidingsroute is niet van toepassing; volstaan wordt met gele attentieborden. Zie bijlage 1.

Het langzaam verkeer (voetgangers) van en naar de sportvereniging passeert veilig aan de noordzijde het werkvak.

Overig verkeer

Verkeer naar en van nabijgelegen straten ondervindt nauwelijks tot géén hinder.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt de route Hoofdweg westzijde – Langerak – Van Voorstlaan (en omgekeerd). Zie bijlage 1.

Openbaar vervoer

Niet van toepassing.

Landbouwverkeer

Niet van toepassing.

Nood- en hulpdiensten

- de nood- en hulpdiensten ondervinden in principe geen hinder van de werkzaamheden.
- De aannemer stelt een werkplanning en fasering op en legt deze – via de melding bij het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid – voor ter toetsing aan de nood- en hulpdiensten. Zo is voor de nood- en hulpdiensten inzichtelijk wanneer waar wordt gewerkt en of de aannemer voldoet aan de bereikbaarheidseisen.

Verkeerslichten

Niet van toepassing.

Leefbaarheid

- De werkzaamheden worden tijdens de meivakantie uitgevoerd op reguliere werkdagen/werktijden tussen 07.00 uur en 17.00 uur.
- Aan – en afvoer van materiaal via de route Hoofdweg westzijde – Langerak – Van Voorstlaan; zie ook bijlage 1.
- Voor het werken buiten de reguliere werktijden dient de aannemer een vergunning aan te vragen.

Veiligheid

- De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 517 'Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b'.
- Blusvoorzieningen blijven intact (brandkranen worden gemarkeerd).
- Werken rond bomen volgens bomenposter *Werken rond bomen* van het Norminstituut bomen.
- Het werkterrein afsluiten voor passanten; voetgangers naar en van de sportvereniging moet veilig langs het werk kunnen passeren.

Communicatie

- De sportvereniging Abbenes en de dorpsraad Abbenes worden tijdig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden door de gebiedsbeheerder Zuid en wordt gevraagd de werkzaamheden te plaatsen op de eigen website en te vermelden in eigen nieuwsbrief .
Actie: gemeente.
- Een aantal nabij gelegen woningen ontvangt een bewonersbrief (twee weken vooraf). In deze brief staat aangegeven wat het werk inhoudt, de totale duur van de werkzaamheden, (eventueel) de fasering, (eventueel) waar informatie op internet is na te lezen en de naam van de contactpersoon. Zie bijlage 2.
Actie: gemeente.
- Passanten worden door middel van attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de afsluiting) gewezen. *Actie: aannemer.*
- Melding in de InforMeer. *Actie: gemeente.*
- Informatie op de website. *Actie: gemeente.*

Melding

Uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van werkzaamheden dienen de werkzaamheden door de aannemer digitaal te worden gemeld ter toetsing bij het Coördinatiepunt bereikbaarheid (CB) via de link:

<https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel>, inclusief goedgekeurde faserings- en bebordingplan (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen).


De directievoerder meldt, ter controle, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, de feitelijke startdatum aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid.

Wijziging planning

Bij wijziging van de planning moet de aannemer dit direct melden aan de directievoerder die op zijn beurt dit terstond terugkoppelt aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid. Het Coördinatiepunt Bereikbaarheid toetst of het werk inderdaad uitgesteld kán worden. Pas na goed keuring kan doorgewerkt worden conform de nieuwe planning. Zie bijlage 3.

Bijlage 1 Werktekening


In figuur 2 staat de werktekening met de uit te voeren werkzaamheden.

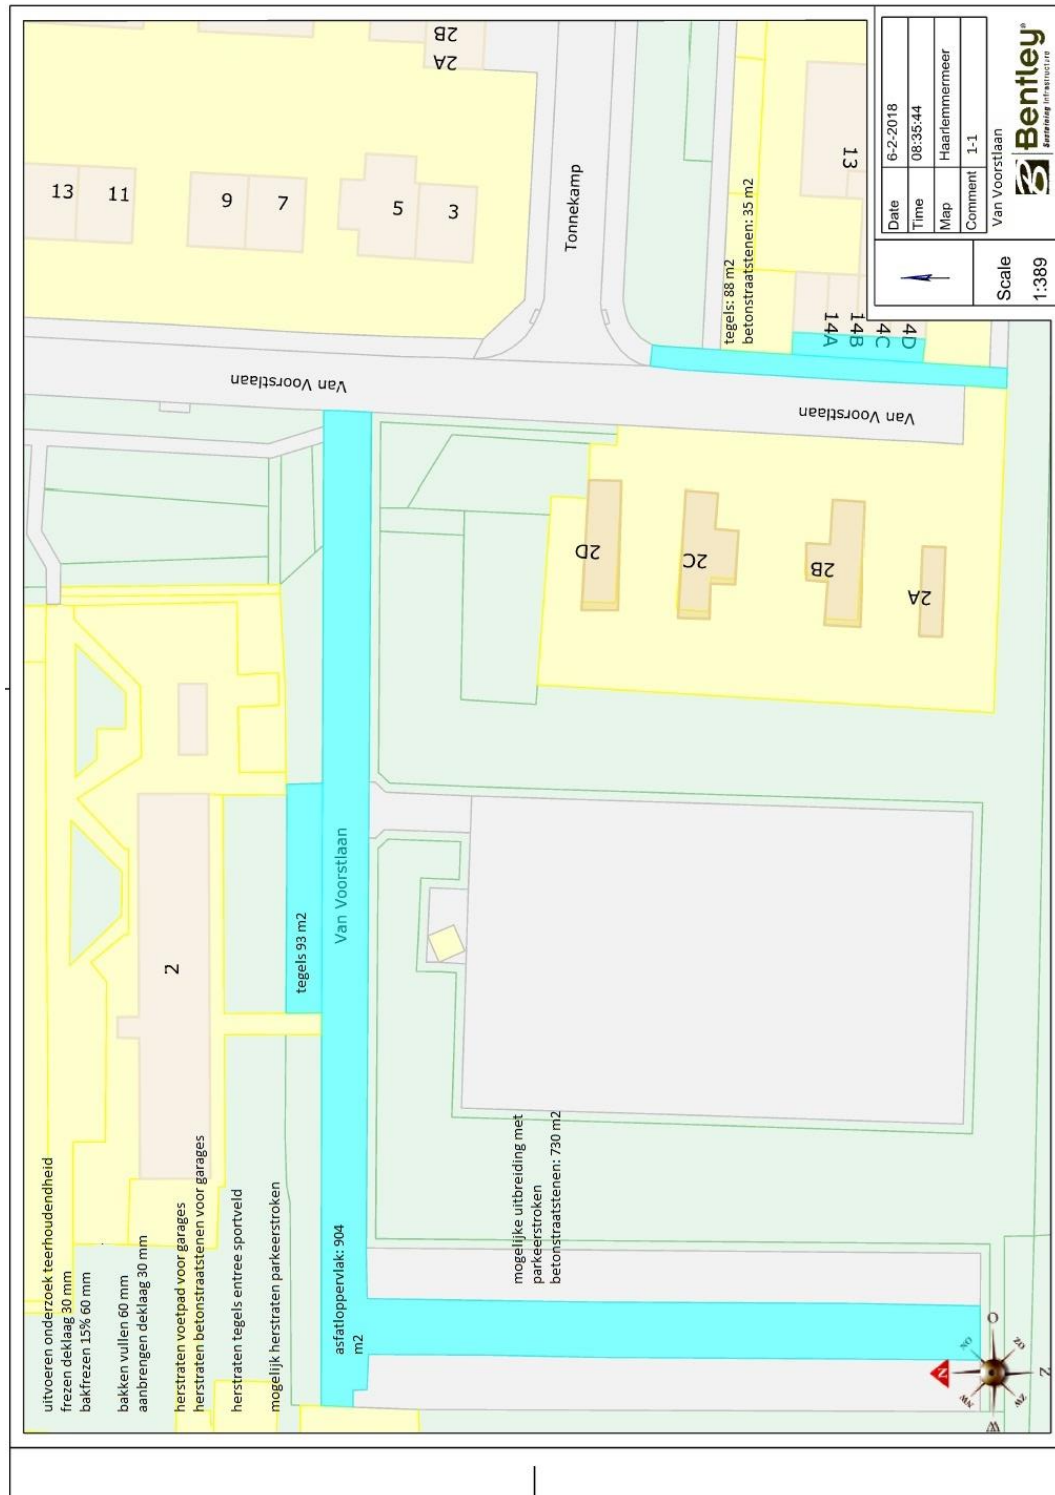

Figuur 2: Overzicht werktekening (bron: www.geoviewer.nl)

Bijlage 2 Route bouwverkeer

In figuur 3 staat de route voor het bouwverkeer; deze voert over de Hoofdweg westzijde – Langerak en de Van Voorstlaan (en omgekeerd).

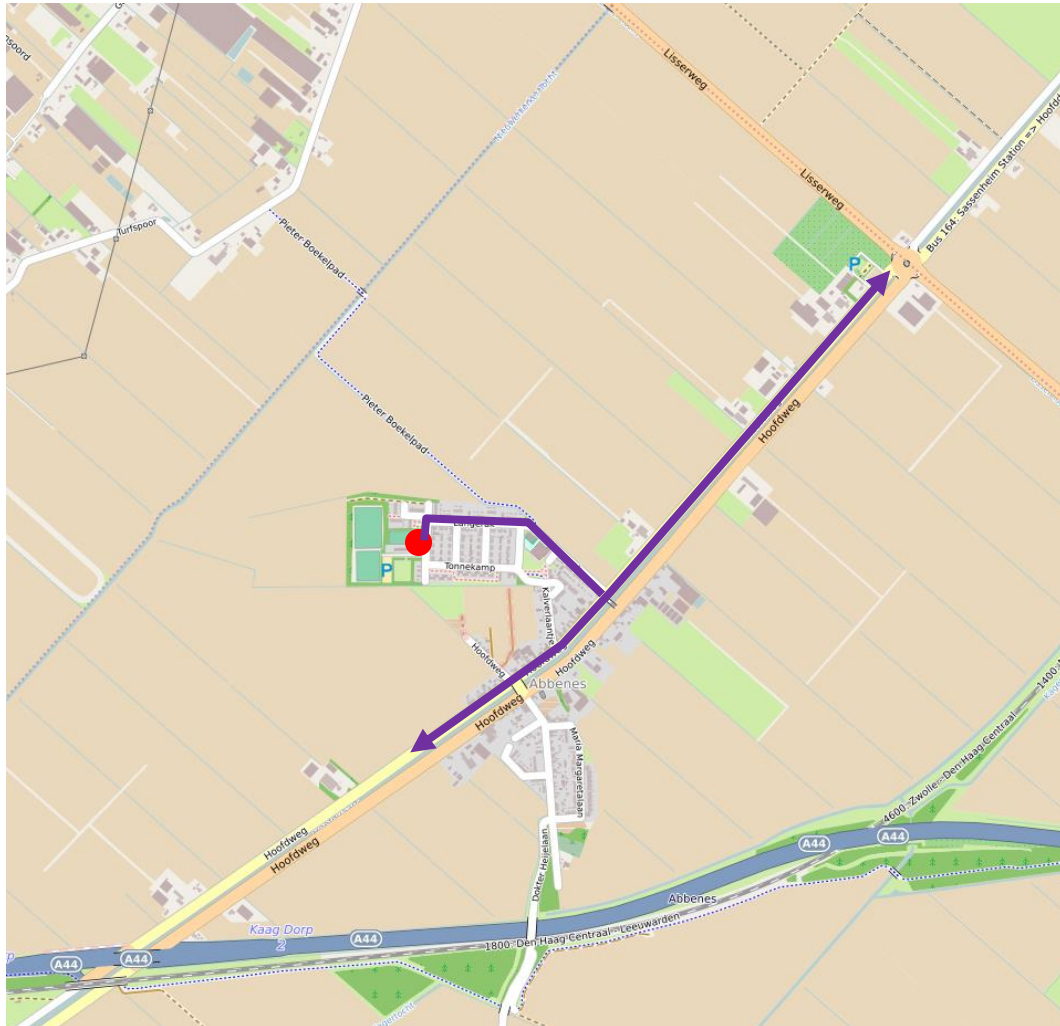

Figuur 3: Overzicht route bouwverkeer en locatie aankondigings- en attentieborden
(bron: www.openstreetmap.nl)

Rood: locatie van de aankondigings- en attentieborden
Paars: route bouwverkeer

Tekst bord: 'Van Voorstlaan afgesloten'
'van 2 tot en met 9 mei 2018'
www.haarlemmermeer.nl/verkeer

Bijlage 3 Verspreidingsgebied bewonersbrief

In figuur 4 staat het voorgestelde verspreidingsgebied weergegeven ten behoeve van de bewonersbrief. Dit kan nog wijzigen; dit te bepalen in overleg tussen GM6 en het IB.



Figuur 4: Overzicht voorgesteld verspreidingsgebied bewonersbrief (bron: www.openstreetmap.nl)

De bewonersbrief ook verzenden aan de dorpsraad Abbenes.
Zie bijlage 3.

Bijlage 4 Communicatieplanning

Datum	Wat	Wie
Week 14	CB informeert nood- en hulpdiensten GBZ informeert dorpsraad GM6 en IB stellen bewonersbrief op	gemeente gemeente gemeente
Week 16	Versturen bewonersbrief	gemeente
Week 17	Plaatsen aankondigingsborden Website online Melding in InforMeer	aannemer gemeente gemeente
02-05-2018	start werkzaamheden amoveren plaatsen attentieborden	aannemer aannemer
09-05-2018	voltooien werkzaamheden verwijderen attentieborden en tijdelijke verkeersmaatregelen	aannemer aannemer

NAW-gegevens voor het verstrekken van informatie

Stichting dorpsraad Abbenes	sv Abbenes
Hoofdweg 1641	Van Voorstlaan 2
2157 PB Abbenes	2157 PM Abbenes
dorpsraad@abbenes.net	secretariaat@svabbenes.nl
06 – 47 94 06 67	0252 - 545811

Toe te passen middelen

- Bewonersbrief (2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden)
- Aankondigings- en attentieborden (plaatsen na versturen bewonersbrief)
- InforMeer (1 week vooraf)
- internet (online na versturen bewonersbrief).
- Indien de aannemer publicaties over dit werk doet in vakbladen, eigen website of internet dit inhoudelijk afstemmen met de communicatiemedewerker van de opdrachtgever.

Wie verzorgt de communicatie?

- De projectleider van het ingenieursbureau verantwoordelijk voor de bewonersbrief (i.s.m. GM6)
- De gemeentelijke directievoerder is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden

Contactschema

NAW-gegevens uitvoeringswerkzaamheden

Projectleider IB	Jaap den Breejen	tel 023-5674452	J.den.Breejen@haarlemmermeer.nl
Werkvoorbereider	Wim Kwinkelenberg	tel 023-5674326	Wm.Kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl
Directievoerder	Ron de Lange	tel 023-5677460	R.de.Lange@haarlemmermeer.nl
Bereikbaarheid	Paul Broekhoff	tel 023-5674390	paul.broekhoff@haarlemmermeer.nl
